المجلس التنفيذي
THE EXECUTIVE COUNCIL

سيطرة · لوحة محفظة المشاريع

مستجدات محفظة المشاريع

حتى تاريخ 30/09/2026 · جميع القطاعات والوحدات والجهات

اللوحة الشهرية | **محفظة المشاريع**

● معاينة تصميم · بيانات توضيحية

مقارنة توضيحية مع التقرير السابق · 31/08/2026

القطاع: جميع القطاعات
الوحدة التنظيمية: جميع الوحدات
الجهة المعنية: جميع الجهات
● نطاق التقرير الكامل
نسخة التقرير

جميع أنواع المشاريع · جميع الأولويات · جميع مديري المشاريع

الالتزامات وتقدم الإنفاق

درهم · مبالغ توضيحية

الموازنة المعتمدة

58,275,000
↑ 2,913,750 درهم

الالتزام بالموازنة

■ المخصص	☐ غير المخصص
46,620,000 80.0%	**11,655,000** 20.0%
↑ 2,331,000 درهم	↑ 582,750 درهم

الإنفاق حسب الفواتير والمتبقي

■ المنفق حسب الفواتير	☐ المتبقي من الموازنة
20,396,250 35.0%	**37,878,750** 65.0%
↑ 1,019,812.5 درهم	↑ 1,893,937.5 درهم

قيمة الأعمال المنجزة

23,018,125 39.5%
↑ 0.3 نقطة مئوية
↑ 1,299,343.75 درهم

0% — 100%

جميع النسب من الموازنة المعتمدة. قيمة الأعمال المنجزة تختلف عن المنفق حسب الفواتير.

تقدم المشاريع حسب الربع والشهر

بحسب موعد انتهاء المشروع · تاريخ التقرير: 30/09/2026

2026

81 مشروعًا

الربع / الشهر	العدد	الحالات · عدد المشاريع	متوسط الإنجاز %
Q2	**1**	إجمالي الربع	**100.0%**
يونيو	1	■ منجز **1**	**100.0%**
Q4	**80**	إجمالي الربع	**39.0%** ↑ 0.6 نقطة مئوية
أكتوبر	1	■ قيد العمل **1**	**75.0%**
ديسمبر	79	■ منجز **9** ↑ 1 ■ قيد العمل **57** ↓ 1 ■ لم يبدأ **7** ■ معلق **3** ■ منقول **2** ■ ملغى **1**	**38.5%** ↑ 0.6 نقطة مئوية

2027

3 مشروعًا

الربع / الشهر	العدد	الحالات · عدد المشاريع	متوسط الإنجاز %
Q1	**3**	إجمالي الربع	**15.0%**
فبراير	3	■ قيد العمل **3**	**15.0%**

كل شريط يوزع حالات الشهر بنسبة 100%؛ العدد منفصل. متوسط الربع من نسب مشاريعه المسجلة.

حالة المشاريع

العدد والموازنة ومتوسط الإنجاز في عرض واحد

84
مشروعًا

الحالة	العدد مشروع	الموازنة درهم	الإنجاز % متوسط النسب المسجلة
■ منجز	**10** ↑ 1	**7,300,000** ↑ 661,875 درهم	**100.0%**
■ قيد العمل	**61** ↓ 1	**42,400,000** ↑ 1,823,125 درهم	**37.0%** ↓ 0.2 نقطة مئوية
■ لم يبدأ	**7**	**4,000,000** ↑ 200,000 درهم	**0.7%**
■ معلق	**3**	**2,537,500** ↑ 126,875 درهم	**0.0%**
■ منقول	**2**	**1,262,500** ↑ 63,125 درهم	**0.0%**
■ ملغى	**1**	**775,000** ↑ 38,750 درهم	**0.0%**
الإجمالي	**84**	**58,275,000** ↑ 2,913,750 درهم	**38.9%** ↑ 0.6 نقطة مئوية

الإنجاز متوسط النسب المسجلة؛ يختلف عن نسبة المشاريع المصنفة منجزة.

أولوية متابعة محافظ مديري المشاريع

أعلى 3 حسب حجم المحفظة غير المنجزة · العدد والموازنة

الترتيب	المدير	المشاريع المنجز / الإجمالي	موازنة المشاريع · درهم موازنة المنجز / الإجمالي
1	**مدير توضيحي 2**	2 / 28 7.1% غير المنجز: 26 مشروعًا	1,887,500 / 19,075,000 9.9% غير المنجز: 17,187,500 درهم
2	**مدير توضيحي 3**	4 / 28 14.3% غير المنجز: 24 مشروعًا	2,250,000 / 19,425,000 11.6% غير المنجز: 17,175,000 درهم
3	**مدير توضيحي 1**	4 / 28 14.3% ↑ 3.6 نقطة مئوية غير المنجز: 24 مشروعًا	3,162,500 / 19,775,000 16.0% ↑ 1.6 نقطة مئوية غير المنجز: 16,612,500 درهم

الترتيب: 50% من حصة العدد غير المنجز و50% من حصة موازنته. الأشرطة تعرض المنجز مقابل الإجمالي؛ نسبة الموازنة ليست نسبة الإنفاق.

عدد المشاريع حسب الأولوية والنوع

تقاطع الأولوية ونوع المشروع

الأولوية	عدد المشاريع	المجموع
H عالية	■ استراتيجي **51** ■ تشغيلي **16**	**67**
M متوسطة	■ استراتيجي **8** ■ تشغيلي **9**	**17**

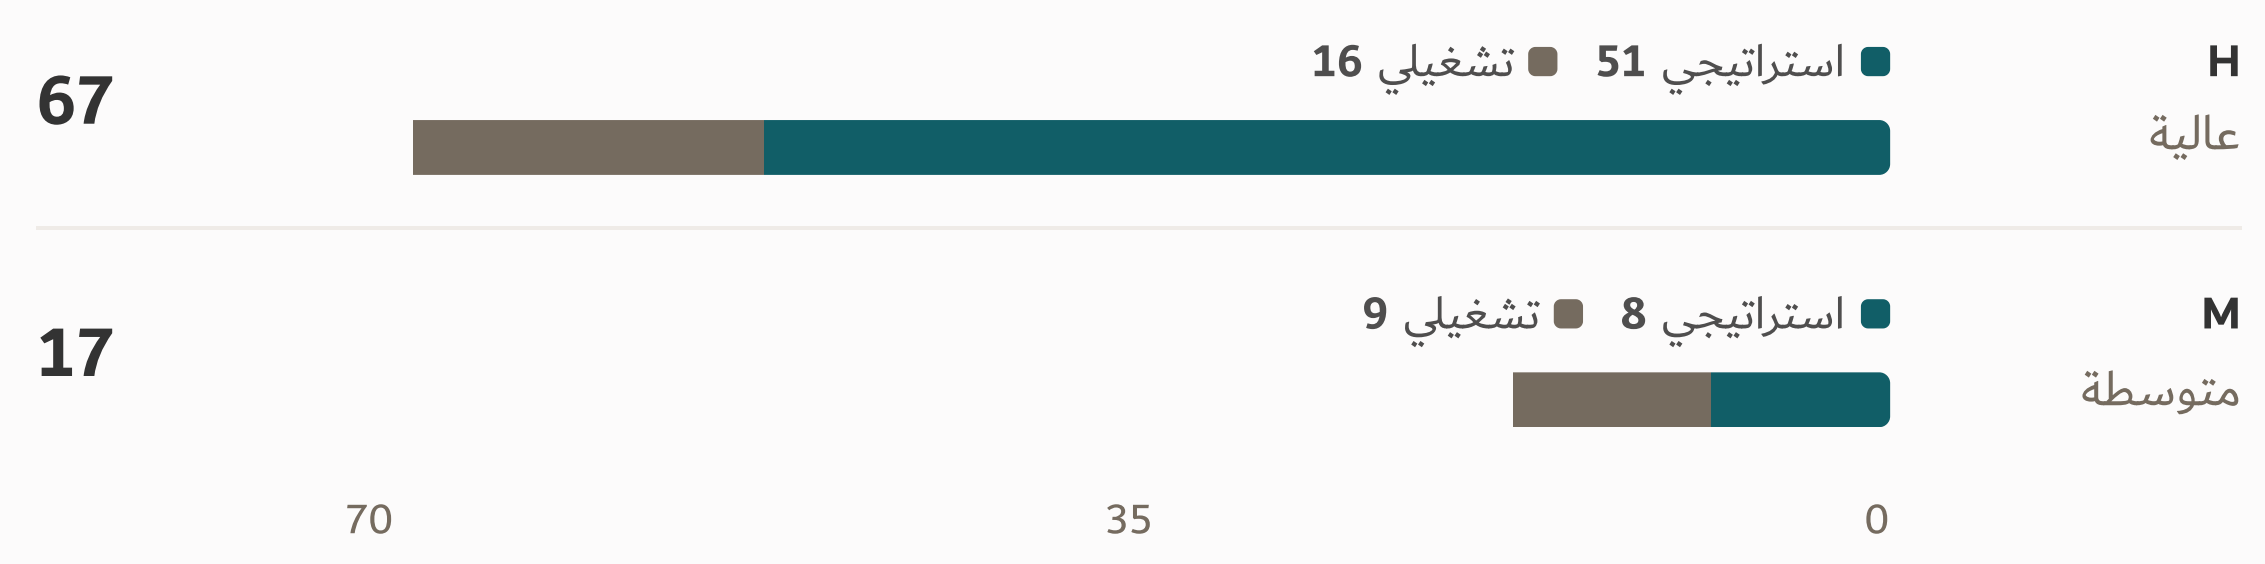

الإجمالي 84 مشروعًا

الأعداد من تقاطع النوع والأولوية؛ مقياس واحد لكلا الصفين.

الموازنة حسب الأولوية والنوع

تقاطع الأولوية ونوع المشروع

الأولوية	مليون درهم	المجموع
H عالية	■ استراتيجي **37.4625** ↑ 1.873125 ■ تشغيلي **9.7875** ↑ 0.489375	**47.25** ↑ 2.3625
M متوسطة	■ استراتيجي **6.225** ↑ 0.31125 ■ تشغيلي **4.8** ↑ 0.24	**11.025** ↑ 0.55125

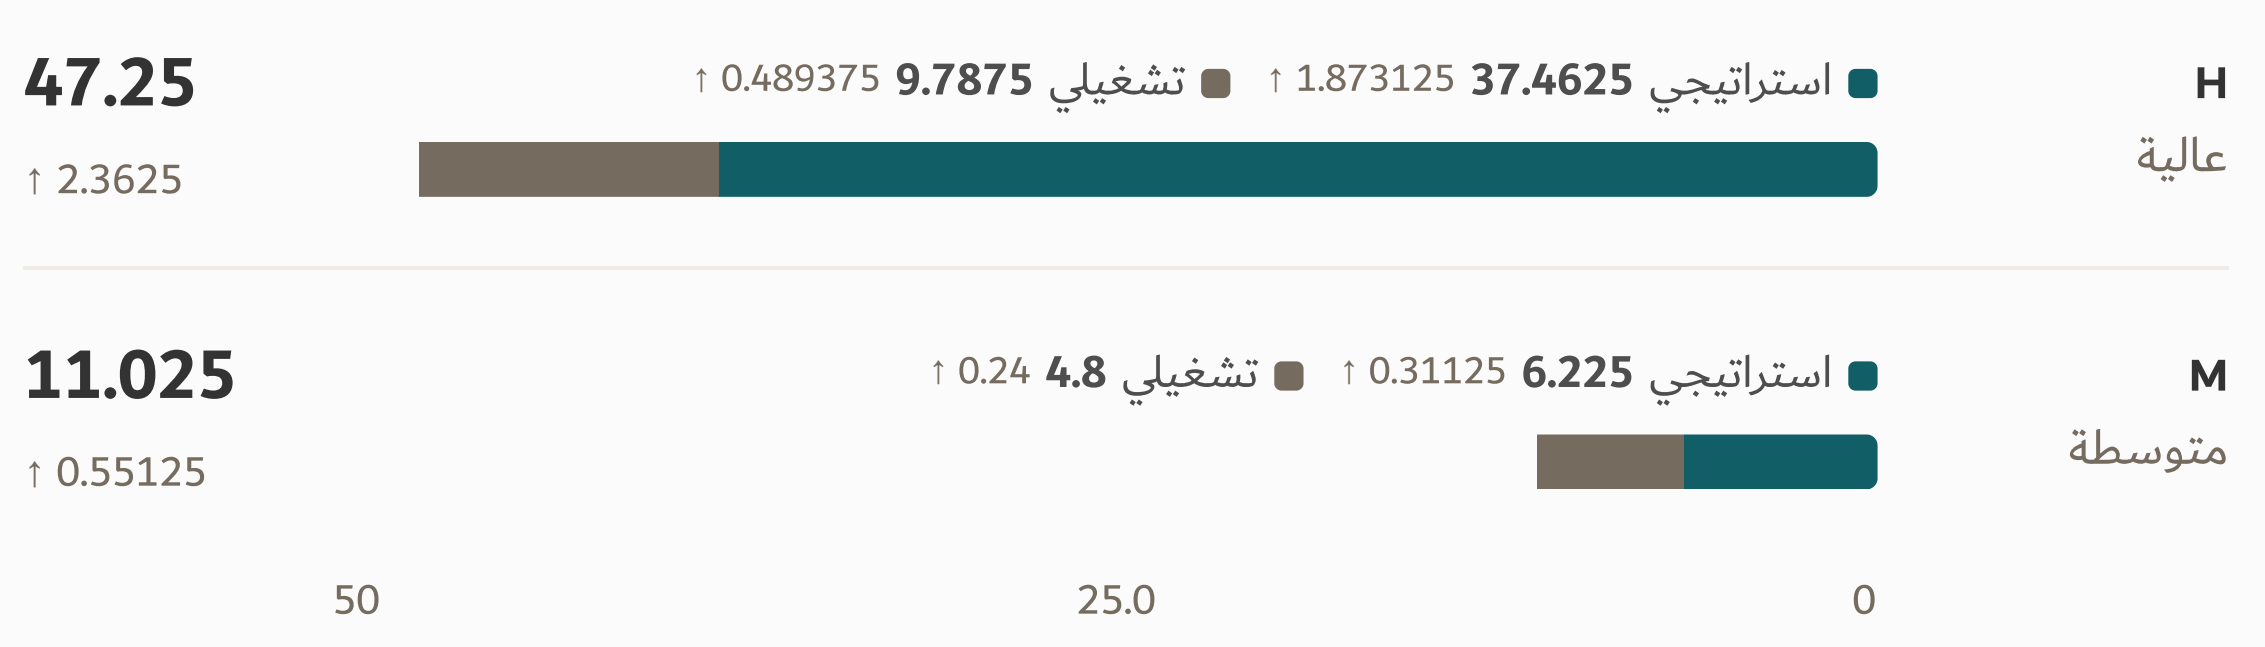

الإجمالي 58.275 مليون درهم ↑ 2.91375 مليون درهم

المبالغ توضيحية؛ تقاس الأشرطة على مقياس مالي واحد.

المشاريع التي تتطلب المتابعة

ضمن نطاق محفظة المشاريع الحالية

12 ↓ 1 مشروعًا

المفتوح المتأخر، أو المعلق، أو الذي لم يبدأ، أو غير المنجز وله ملاحظة مسجلة. يُحسب كل مشروع مرة واحدة.

المشروع	القطاع / الوحدة	مدير المشروع	الحالة / الإنجاز / الموعد	الملاحظات
مشروع استراتيجي توضيحي 049	التميز والخدمات الحكومية التقييم والدراسات	مدير توضيحي 2	ملغى 0.0% ديسمبر 2026	ملاحظات مدير المشروع ملاحظة توضيحية: يتطلب البند مراجعة المستجدات وتأكيد الخطوة المقبلة مع الوحدة المعنية.
مشروع استراتيجي توضيحي 006	الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة الاتصال الحكومي	مدير توضيحي 1	معلق 0.0% ديسمبر 2026	
مشروع استراتيجي توضيحي 076	التنمية المستدامة	مدير توضيحي 2	معلق 0.0% ديسمبر 2026	
مشروع استراتيجي توضيحي 082	الحوكمة الحوكمة	مدير توضيحي 2	معلق 0.0% ديسمبر 2026	
مشروع استراتيجي توضيحي 013	الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة المشتريات والشؤون الإدارية	مدير توضيحي 2	لم يبدأ 0.0% ديسمبر 2026	
مشروع استراتيجي توضيحي 015	الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة تقنية المعلومات	مدير توضيحي 1	لم يبدأ 0.0% ديسمبر 2026	
مشروع استراتيجي توضيحي 017	الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة تقنية المعلومات	مدير توضيحي 3	لم يبدأ 0.0% ديسمبر 2026	
مشروع استراتيجي توضيحي 026	الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة تميز الموارد البشرية	مدير توضيحي 3	لم يبدأ 0.0% ديسمبر 2026	
مشروع استراتيجي توضيحي 031	الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة تميز الموارد البشرية	مدير توضيحي 2	لم يبدأ 0.0% ديسمبر 2026	
مشروع استراتيجي توضيحي 052	التميز والخدمات الحكومية التقييم والدراسات	مدير توضيحي 2	لم يبدأ 0.0% ديسمبر 2026	
مشروع استراتيجي توضيحي 075	التنمية المستدامة	مدير توضيحي 1	لم يبدأ 5.0% ديسمبر 2026	
مشروع استراتيجي توضيحي 001	الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة الاتصال الحكومي	مدير توضيحي 2	قيد العمل 75.0% ديسمبر 2026	ملاحظات مدير المشروع ملاحظة توضيحية: يتطلب البند مراجعة المستجدات وتأكيد الخطوة المقبلة مع الوحدة المعنية. ملاحظات المالية ملاحظة توضيحية: يتطلب البند مراجعة المستجدات وتأكيد الخطوة المقبلة مع الوحدة المعنية.

معاينة تصميم المعاينة تستخدم بيانات اللوحة الشهرية التوضيحية نفسها؛ أسماء المشاريع والمديرين والملاحظات والمبالغ أمثلة. الأسهم توضح فرق لقطتين تجريبيتين بتاريخ 31/08/2026 و30/09/2026؛ لا تمثل تغيرات فعلية. القالب الأصلي ومعادلاته لم تتغير.

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي

تصور بصري لمحفظة المشاريع · TEC Apple-Inspired Design
